Actualité du projet
Aqua Domitia

Groupe Technique Ressources – Instance Aqua Domitia

20 mars 2018

Aqua Domitia : le transfert de l ’eau du Rhône
une ressource complémentaire fiable et durable au service des territoires

6 maillons indépendants pouvant être réalisés progressivement

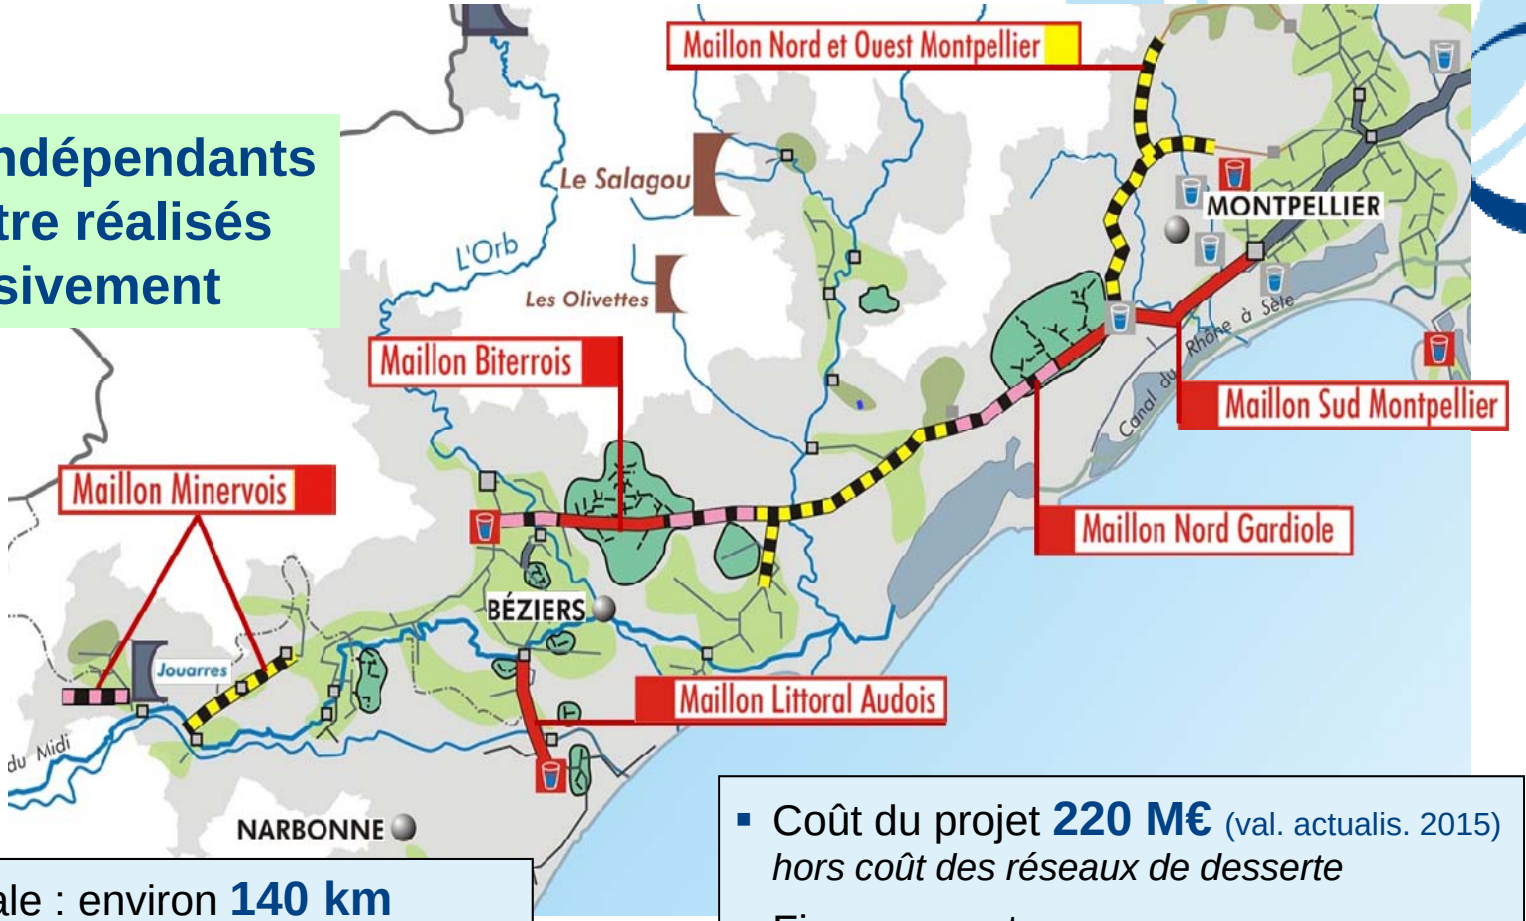

- Longueur globale : environ **140 km**
- Débit max : **2,5 m³/s.**
- Diamètre des conduites : de **600** à **1200 mm**

- Coût du projet **220 M€** (val. actualis. 2015) *hors coût des réseaux de desserte*
- Financement :
  - Région + BRL pour la plus grande part
  - Départements, Collectivités, Agence de l’Eau et bénéficiaires

Aqua Domitia : les conditions de déploiement du projet

- **BRL met en œuvre le projet Aqua Domitia**
  en cohérence avec la délibération de la Région du 6 avril 2012

⇨ **un calendrier de réalisation selon :**

- la **« maturité » de la demande** par territoire
- les **concertations** avec les **acteurs locaux**
- les « **urgences** » de calendrier (FEADER)
- les **montages financiers**
- les **obligations réglementaires**

Aqua Domitia : les Maillons réalisés à fin 2017

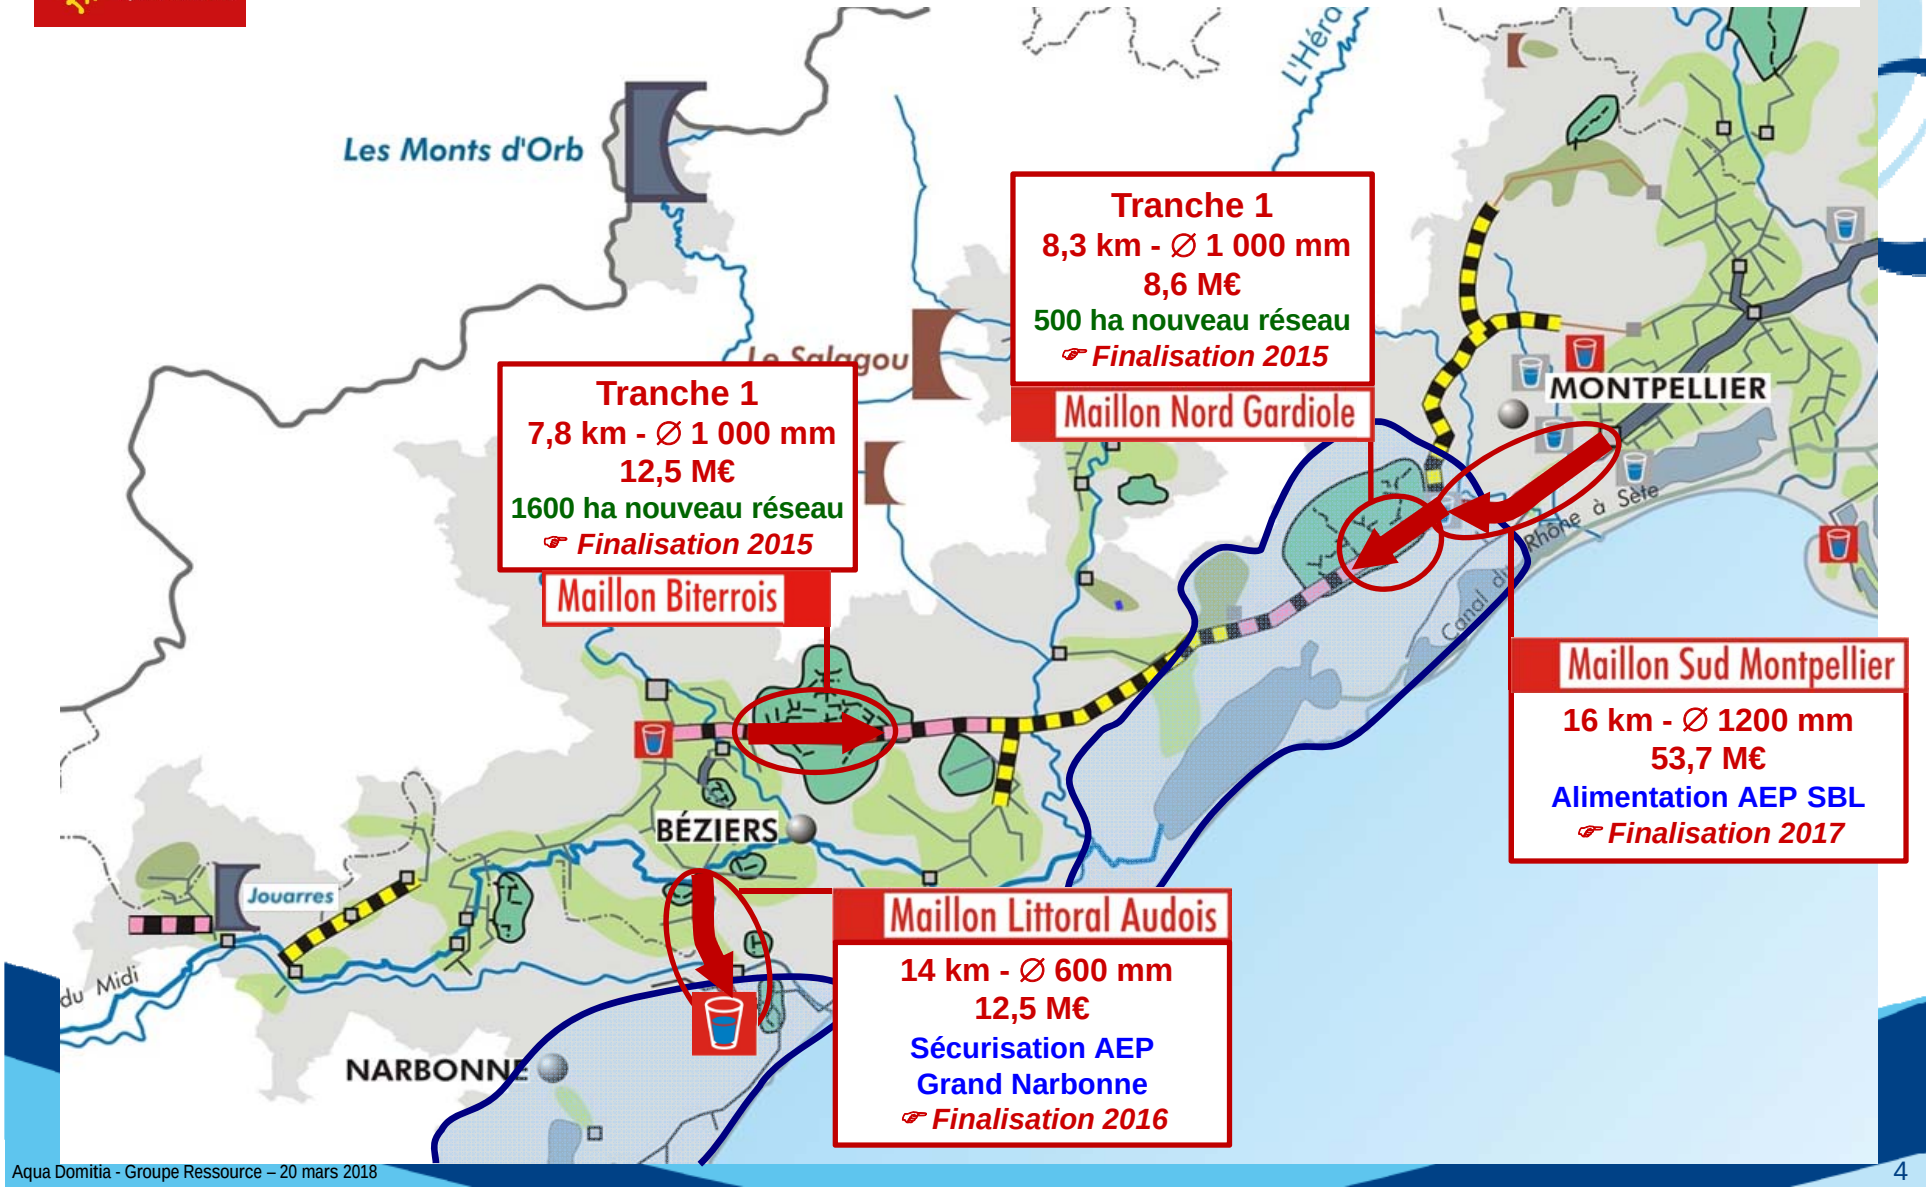

Aqua Domitia : les Maillons engagés pour l'horizon 2020/2021

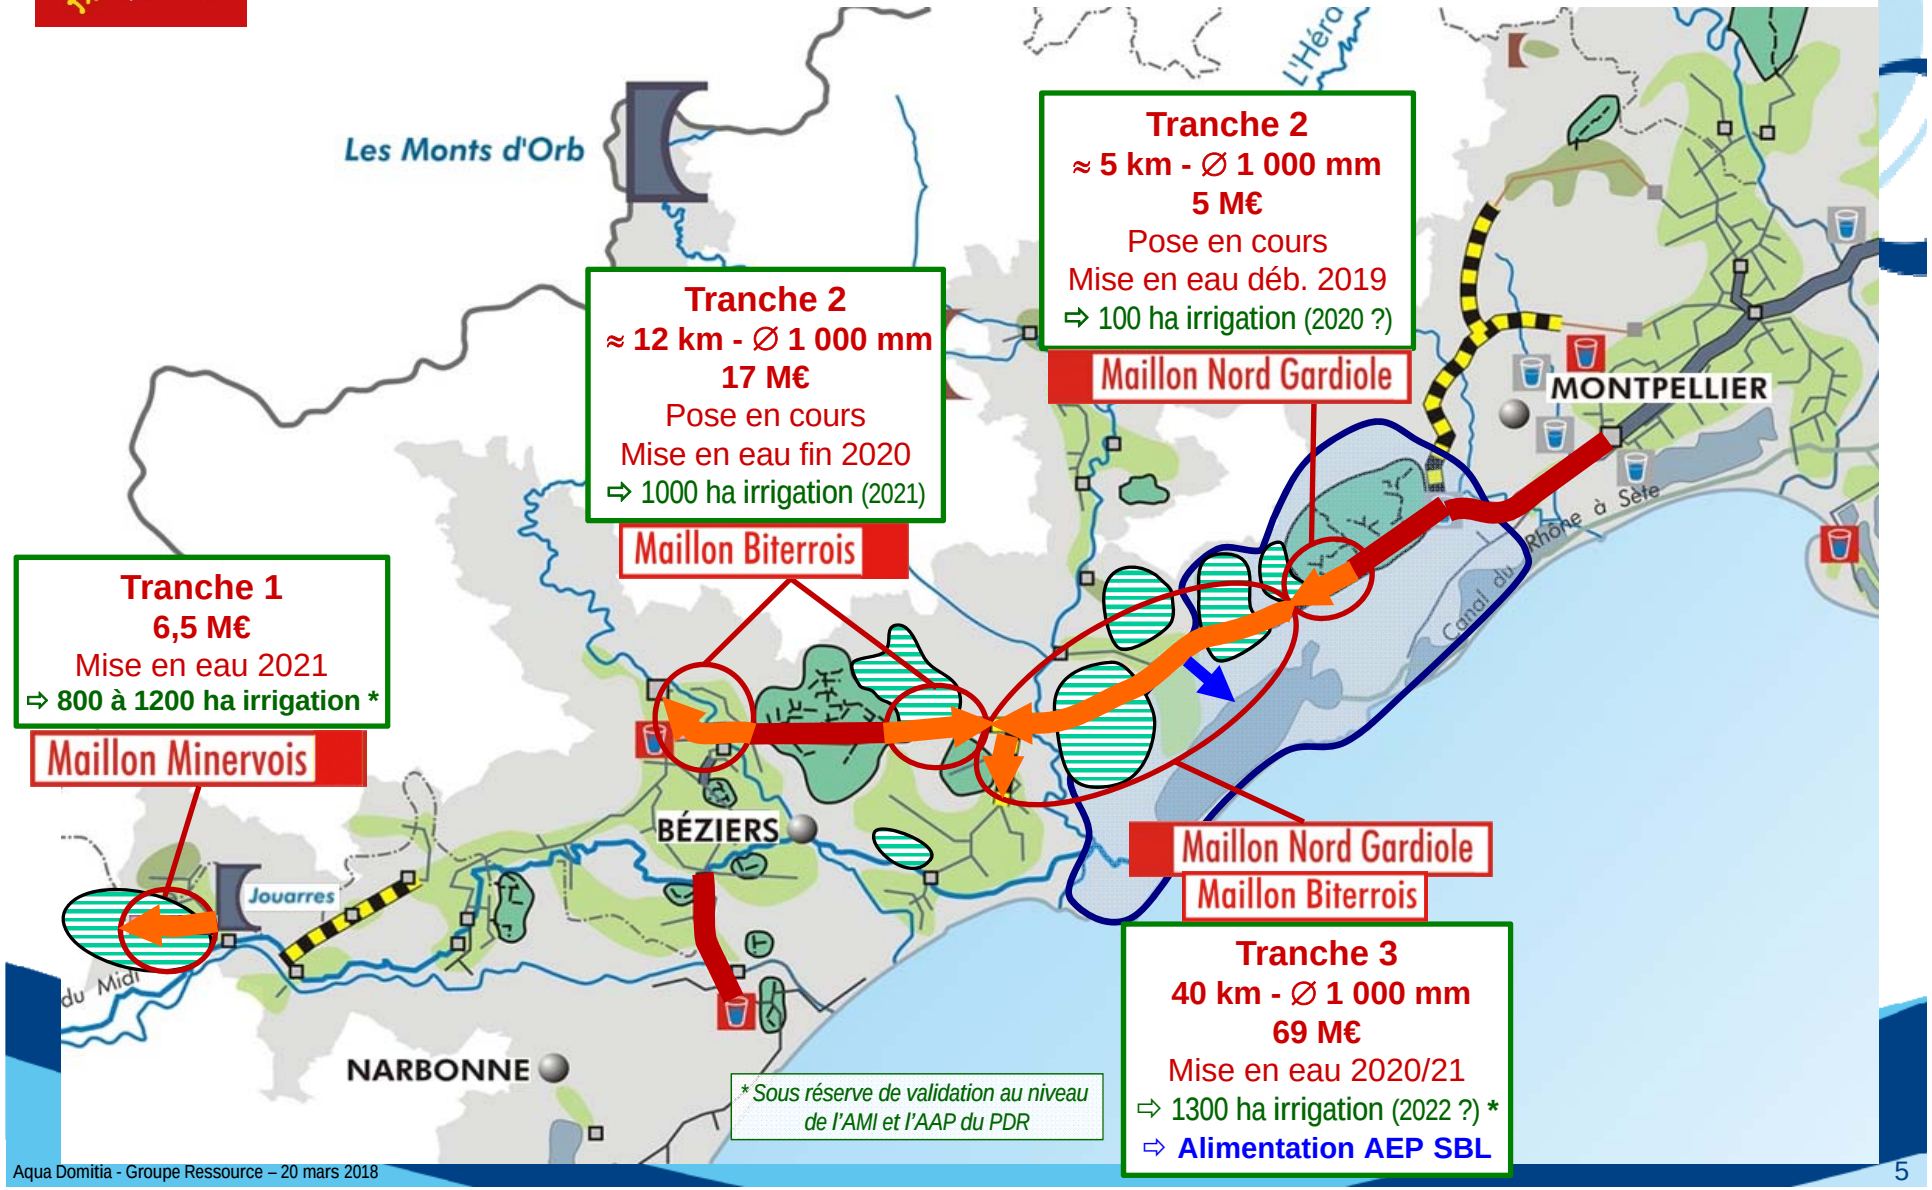

Aqua Domitia : les usages à fin 2021

EAU POTABLE

➔ **Alimentation du SBL**

2 stations de potabilisation à Fabrègues

1 station en projet à Poussan

- **970 l/s**
- **3 à 6 Mm3/an**

EAU POTABLE

➔ **Sécurisation de la station AEP de Puech de Labade**

- **15 communes**
- **plus de 140 000 habitants l'été**
  - **500 l/s**
  - **4 Mm3/an**

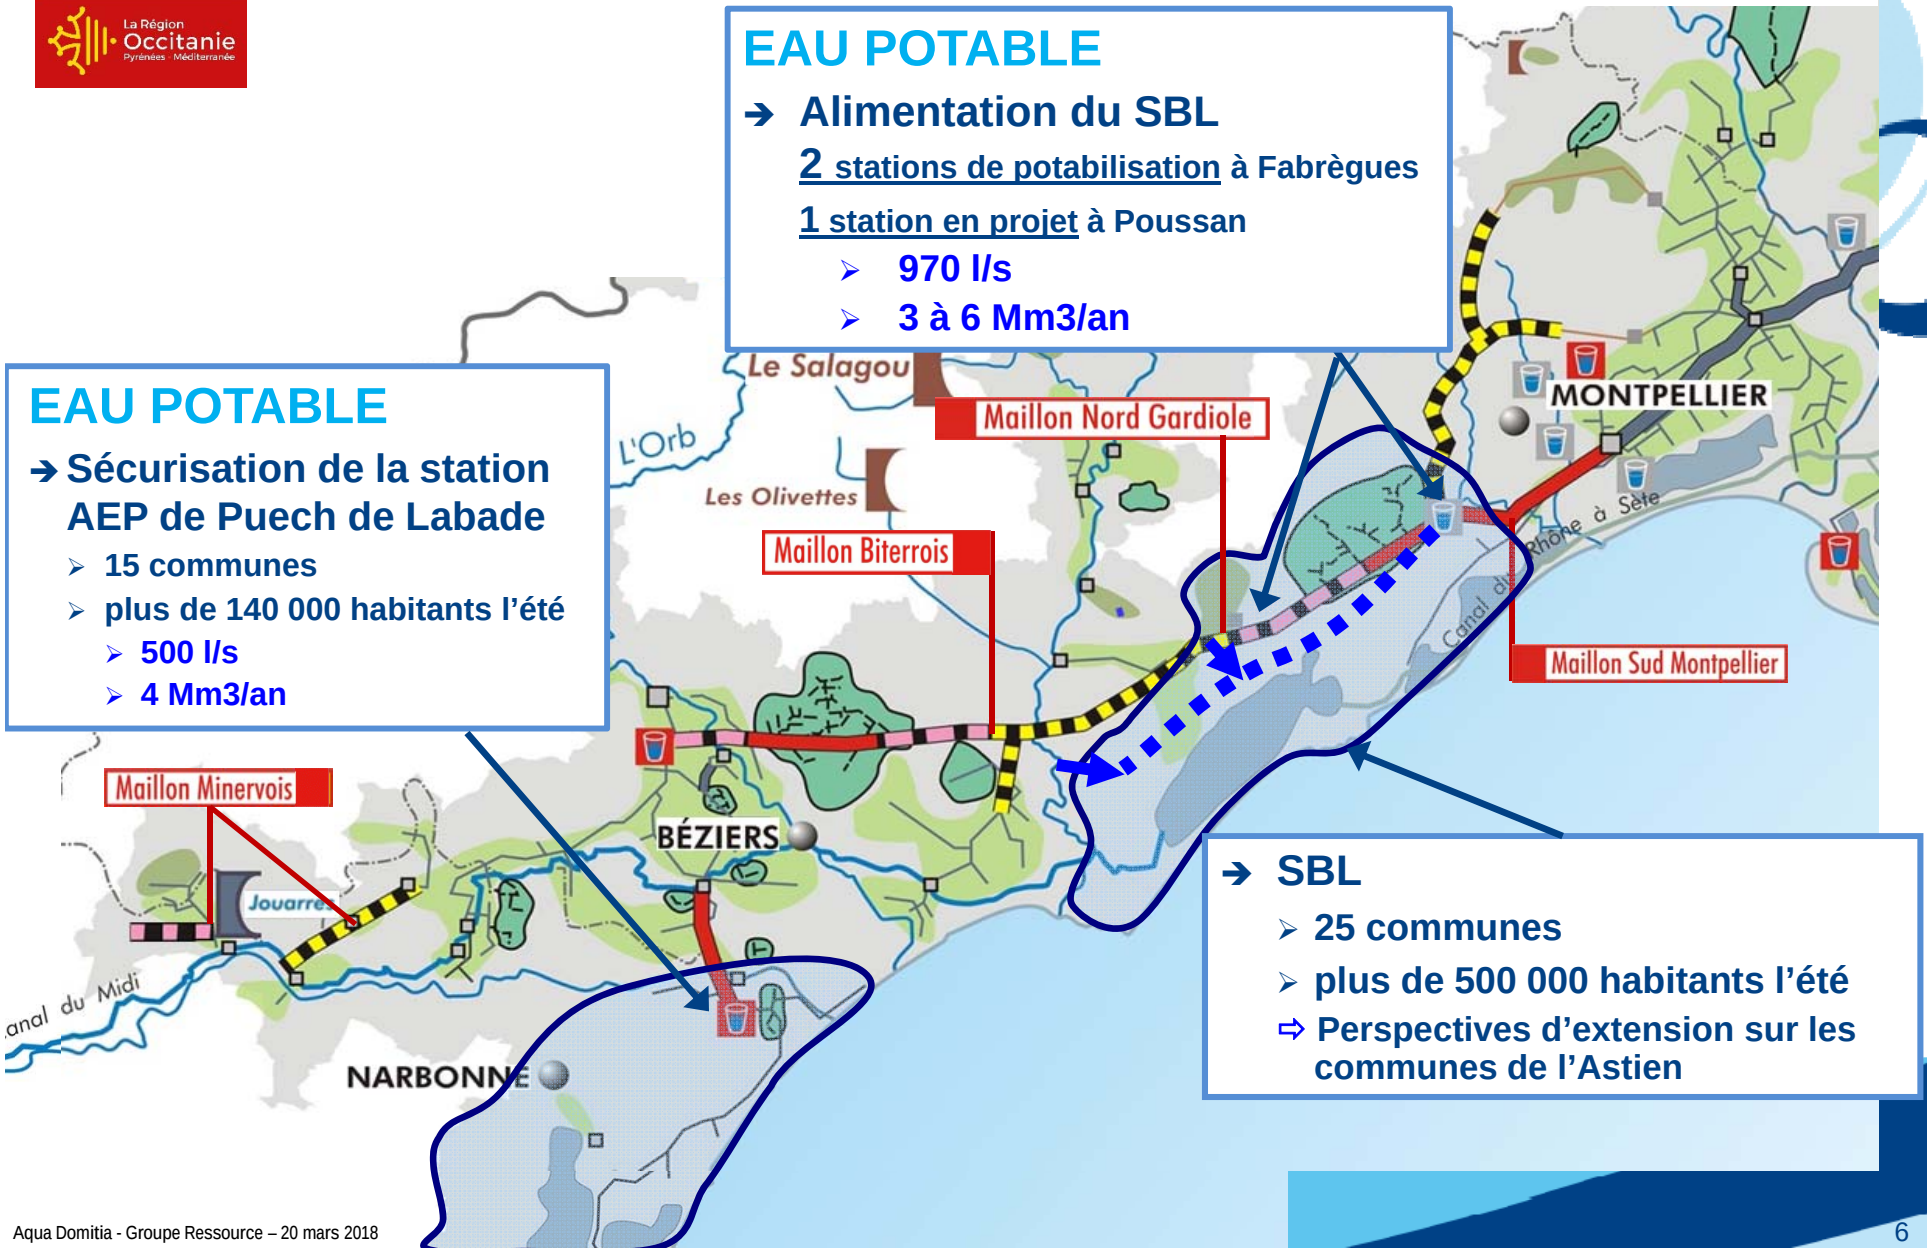

➔ **SBL**

- **25 communes**
- **plus de 500 000 habitants l'été**
- ⇨ **Perspectives d'extension sur les communes de l'Astien**

Aqua Domitia : les usages à fin 2021

IRRIGATION

2014 / 2015 = 2 000 ha

2019 / 2020 = 1 250 ha

2021 / 2022 = 2 900 ha

TOTAL = 6 150 ha
dont ≈ 5000 ha par l'eau du Rhône

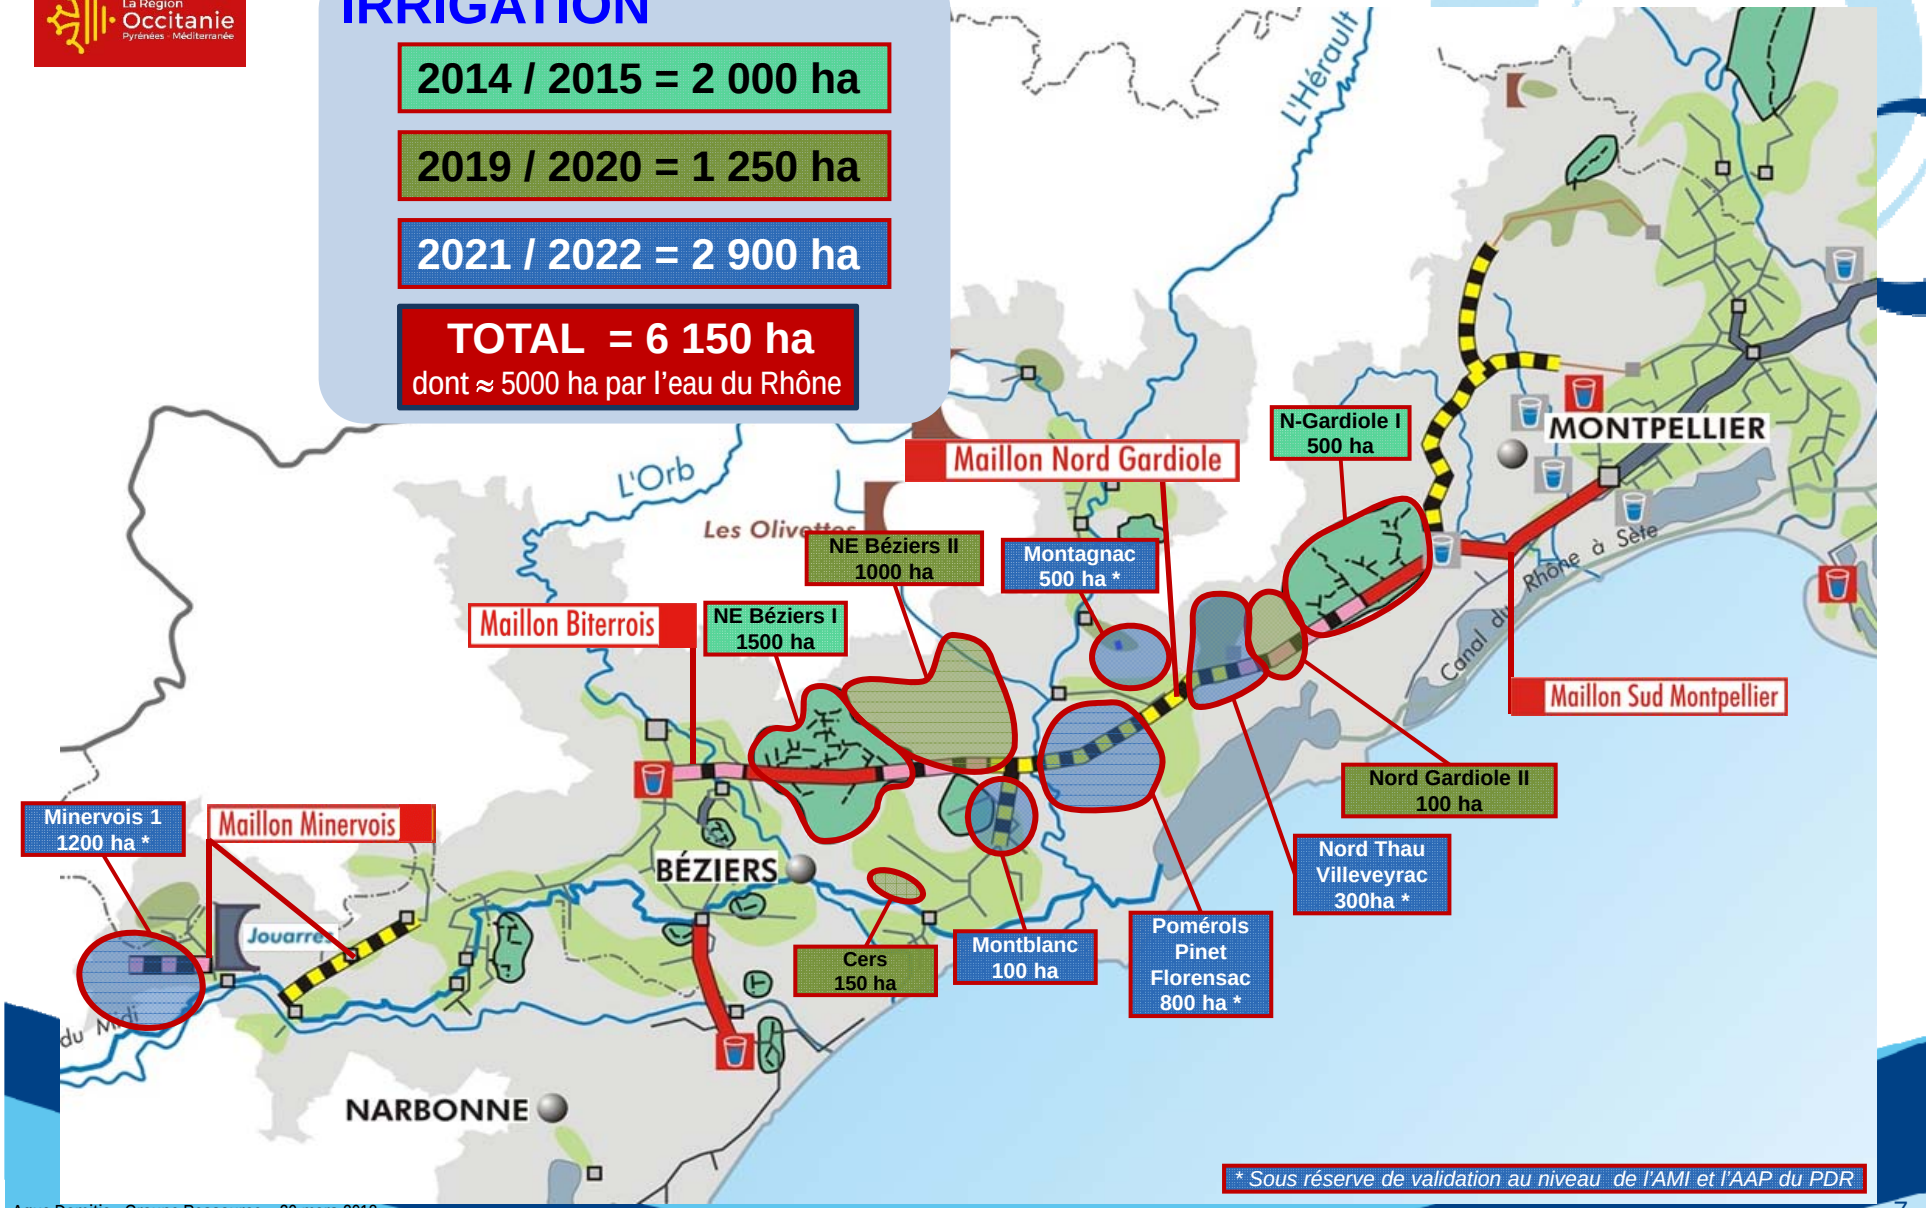

** Sous réserve de validation au niveau de l'AMI et l'AAP du PDR*

Merci de votre attention
